
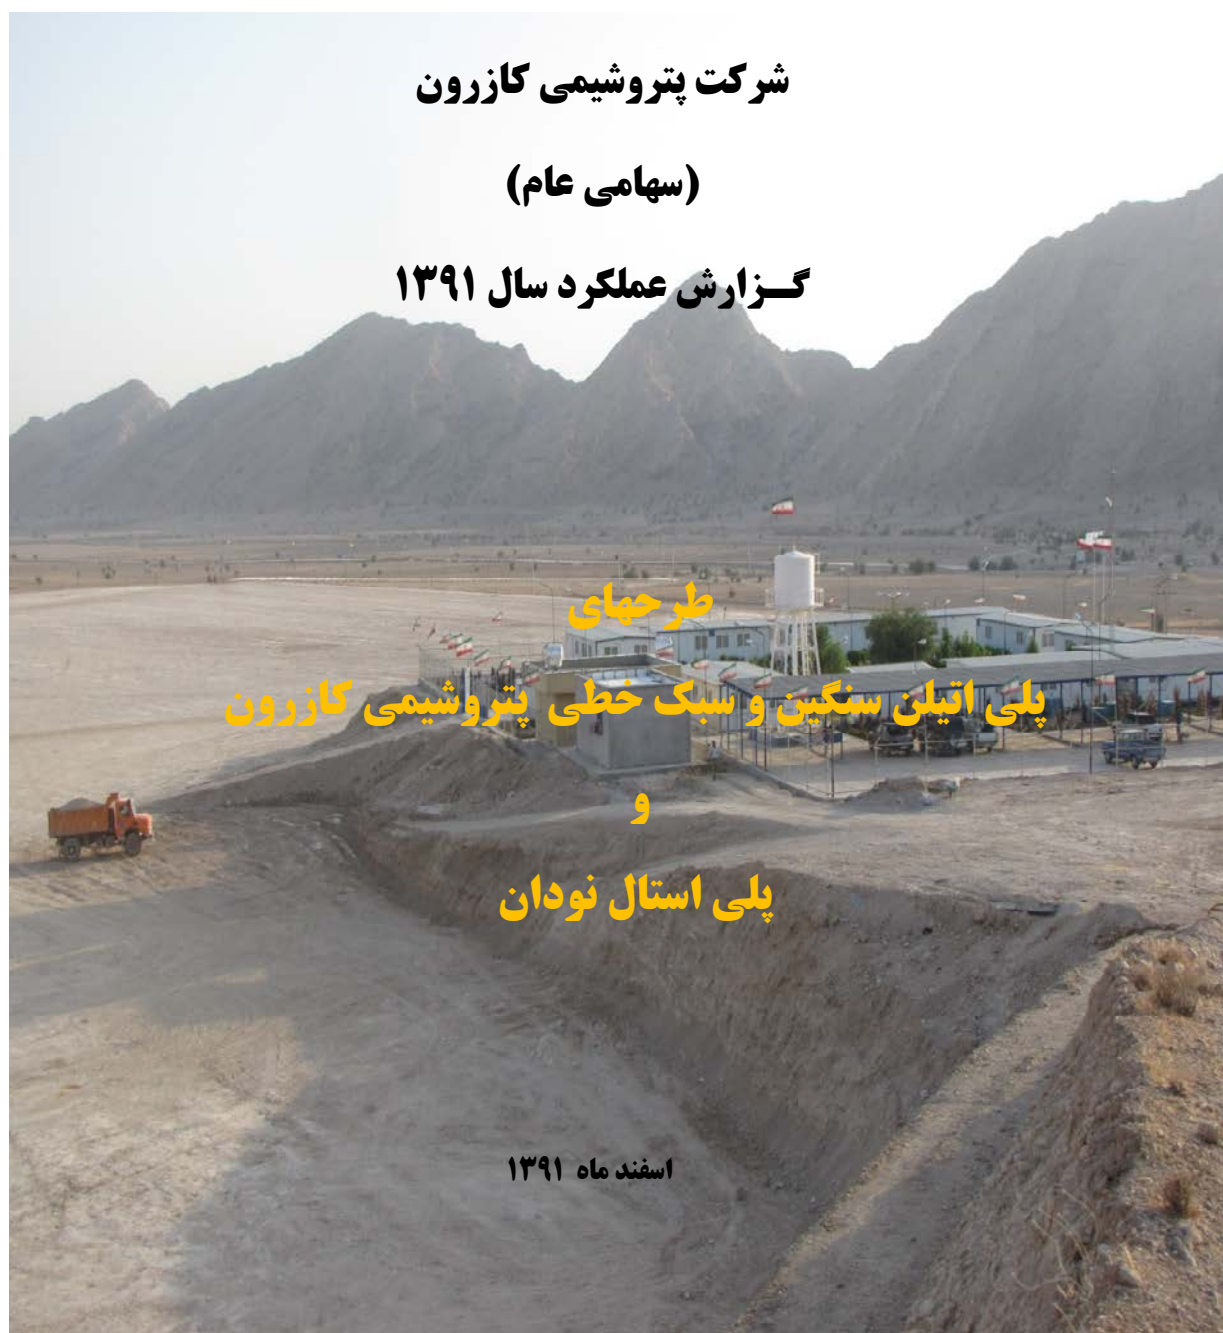
 CCM Co.	گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱	 شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام)
کد پروژه: ۲۱۰	تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی و پلی استال	نام پروژه:
شماره گزارش: ۲۱۰-RPT-CCM-GR/۲	اسفند ۹۱	تاریخ گزارش: اسفند ۹۱







گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱



210	کد پروژه :	تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی پتروشیمی کازرون	نام پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

بخش اول

طرح پلی اتیلن سنگین و سبک خطی کازرون
شرکت پتروشیمی کازرون

	<h2>گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱</h2>		
210	کد پروژه :	تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی پتروشیمی کازرون	نام پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

۱. جدول مشخصات اصلی طرح

طرح پلی اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرون		نام طرح
۳۵ کیلومتری محور شهرستان کازرون به فراشبند		محل احداث
۵۳ هکتار با قابلیت گسترش تا ۱۲۰ هکتار		مساحت زمین
ارزی ۴۲۲ میلیون دلار		برآورد سرمایه گذاری طرح
ریالی ۴۹۱ میلیارد ریال		
نرخ تسعیر		
کل ۴۷۶ میلیون دلار		
-		صاحبان لیسانس
Consortium of AVIC & HFEC		پیمانکار اصلی طرح
EPCCF		نوع قرارداد
۳۴۸,۵ میلیون یورو		مبلغ قرارداد
استفاده از خط اعتباری چین		محل تأمین اعتبار
هنوز موثر نگردیده است		تاریخ موثر شدن قرارداد
۴۲ ماه پس از موثر شدن قرارداد پیمانکار EPCC پروژه		مدت زمان اجرای طرح
پلی اتیلن سنگین ۱۷۵ هزار تن در سال		محصولات تولیدی
پلی اتیلن سبک خطی ۱۲۵ هزار تن در سال		نام و ظرفیت
میزان: ۲۹۰ هزار تن در سال	محل تأمین: مجتمع پتروشیمی گچساران	خوراک طرح
میزان: ۲۴ هزار تن در سال	محل تأمین: مجتمع های پتروشیمی	
میزان: ۱۹۵۰۰۰ مگاوات ساعت در سال	محل تأمین: نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون یا تولید در مجتمع	یوتیلیتی مورد نیاز دوران بهره برداری طرح
میزان: ۴,۶ میلیون متر مکعب در سال	محل تأمین: سد نرگسی	
میزان: ۷۰ میلیون نرمال متر مکعب در سال	محل تأمین: خط لوله سراسری	
آیتم شماره ۱۱ - جدول ج		ترکیب سهامداران طرح
		تعداد افراد شاغل در زمان اجرا و ساخت
۲۴۰ نفر در زمان بهره برداری بطور مستقیم و ۲۵۰ نفر غیر مستقیم جهت امور تعمیرات و نگهداری و سرویس های جانبی از طریق شرکتهای پیمانکاری		تعداد افراد شاغل در زمان بهره برداری





گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱



210	نام پروژه :	تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی پتروشیمی کازرون	کد پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	تاریخ گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	شماره گزارش :

۲. جدول وضعیت سهامداران

ردیف	نام سهامدار	درصد سهامداری	تعداد سهام	آورده نقدی سهامداران	
				آورده نقدی سهامداران (ریالی)	آورده غیر نقدی سهامداران (ریالی)
۱	شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۶,۲۴٪	۱۶۵,۱۹۰,۷۶۹		
۲	شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۱۹,۷۸٪	۹۰,۱۷۷,۰۹۶		
۳	شرکت شادان شهر باختر	۱۱,۹۴٪	۵۴,۴۱۱,۴۵۲		
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران	۵,۴۸٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۵	شرکت بیمه توسعه	۵,۴۸٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۰,۱۱٪	۵۰۰,۰۰۰		
۷	شرکت مهر آوران کوی نارون (سهامی خاص)	۰,۰۳٪	۹۵۱,۵۲۲		
۸	شرکت پتروشیمی گچساران	۰,۰۲٪	۱۱۲,۰۰۰		
۹	مجمع پترو صنعت گامرون	۰,۰۲٪	۱۰۰,۰۰۰		
۱۰	شرکت تعاونی کشاورزی رضوان سداد	۰,۰۱٪	۵۰,۰۰۰		
۱۱	تعاونی روستایی شهید رجایی مرودشت	۰,۰۱٪	۳۰,۰۰۰		
۱۲	شرکت سرمایه گذاری ایران	-	۳,۰۰۰		
۱۳	شرکت بازرگانی پتروشیمی	-	۱,۰۰۰		
۱۴	شرکت کالا بازار ایرانیان	-	۱,۰۰۰		
۱۵	شرکت فراساحل ایران	-	۱,۰۰۰		
	جمع کل سهامداران حقوقی	۷۹,۳۹٪	۳۶۱,۹۲۷,۰۵۹		
	کل سهامداران حقیقی	۲۰,۶۱٪	۹۳,۹۵۸,۴۲۳		
	مجموع سهامداران حقوقی و حقیقی	۱۰۰٪	۴۵۵,۸۸۵,۴۸۲		

	<h2>گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱</h2>		
210	کد پروژه :	تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی پتروشیمی کازرون	نام پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

۳. اهم فعالیتهای و اقدامات انجام شده

• عملیات اجرایی

- اتمام عملیات اجرایی مربوط به تسطیح زمین مجتمع و آماده نمودن آن برای اجرای عملیات ساخت و نصب
- اجرای عملیات کانال هدایت سیلاب بالا دست فاز ۲
- برگزاری جلسات کارگاهی با شرکت فرهاد پی بوشهر جهت رفع نواقص، تسریع فعالیتهای و اتمام عملیات تسطیح
- تحویل قطعی عملیات اجرایی احداث پارکینگ موقت، ساختمان آزمایشگاه و فنس کشی محوطه اداری
- برگزاری جلسه با شرکت فرهاد پی بوشهر جهت بررسی صورت وضعیت قطعی این شرکت
- تحویل قطعی عملیات اجرایی احداث جاده دسترسی موقت مجتمع
- تحویل قطعی پروژه خط روشنایی جاده دسترسی و شبکه برق رسانی به چاه آهکی در تاریخ ۹۱/۰۲/۱۲

• عملیات مهندسی

- اخذ تأییدیه هیأت مدیره محترم شرکت پتروشیمی کازرون نسبت به کپی دانش فنی و مهندسی پروژه از شرکت پتروشیمی امیرکبیر
- موافقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی با عملیات کپی برداری از ليسانس/ مهندسی اصولی بکار گرفته شده در شرکت پتروشیمی امیرکبیر
- انجام پیگیری های مستمر جهت کپی برداری از تکنولوژی شرکت Ineos در پتروشیمی امیر کبیر و انجام مکاتبات لازم در این زمینه
- بررسی بخشی از مدارک مهندسی طرح امیرکبیر
- تهیه و ارائه ITB و تکمیل و نهایی سازی Tender Package مهندسی اصولی و خدمات خرید اقلام خاص



گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱



210	کد پروژه :	تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی پتروشیمی کازرون	نام پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

- برگزاری جلسات در خصوص پروژه خط لوله اتیلن دنا و مشخص نمودن Tie-in و مسیر خط لوله اتیلن به مجتمع پتروشیمی کازرون با حضور مدیریت طرح (MC) در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
- تهیه و ارائه پلان خط اتیلن دنا حسب مختصات دریافتی از شرکت مدیریت توسعه توسط شرکت CCM
- بررسی جهت تعیین محل اولیه ایستگاه اندازه گیری خط اتیلن و گاز طبیعی در اراضی مجتمع
- بازدید کارشناسان شرکت گاز استان فارس از موقعیت ایستگاه اندازه گیری گاز در اراضی مجتمع جهت مشخص نمودن موقعیت مناسب
- تصویب استقرار واحدهای پلی اتیلن سنگین و سبک خطی در زمینهای فاز یک
- دریافت نامه امور مجامع و سهام مبنی بر مالکیت ۳۴/۵۳٪ از سهام شرکت پتروشیمی کازرون توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیرو برگزاری جلسه بررسی راهکارهای استفاده از لیسانس واحد پلی اتیلن سنگین پتروشیمی امیرکبیر در تاریخ ۹۱/۰۸/۲۰ جهت مشخص شدن واجد شرایط بودن پتروشیمی کازرون به منظور استفاده از مزایای Affiliate در قرارداد پتروشیمی امیرکبیر و شرکت Ineos
- پیگیری و دریافت اطلاعات Site Condition نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون جهت نهائی نمودن موقعیت جغرافیایی منطقه در مدارک طراحی و مهندسی پروژه
- دریافت آمار و منابع استخراج اطلاعات پایه طراحی از شرکت پویشگران
- ارائه ریفرنسهای طراحی پارامترهای هواشناسی
- پیگیری و دریافت آنالیز گاز مورد نیاز پتروشیمی کازرون از شرکت ملی گاز ایران جهت استفاده در طراحی و مهندسی اصولی
- پیگیری و دریافت آنالیز آب خام رودخانه منتهی به سد نرگسی
- تهیه گزارش آنالیز نمونه آب چاه حفر شده برای زمان ساختمان و نصب از شرکت زاگرس آبشناس فارس



گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱



210	کد پروژه :	تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی پتروشیمی کازرون	نام پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

- بازدید کارشناسان شرکت از کارخانجات گروه مپنا به منظور بررسی توانمندی های این گروه در ساخت نیروگاه مجتمع
- دریافت پیشنهاد فنی بویلر بازیاب حرارتی و توربین های زوریا (۲۵ مگا واتی) از شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا
- تهیه میزان مصرف بخار در فشارهای مختلف و کندانس برگشتی توسط مدیریت طرح و اعلام به شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا
- تهیه گزارش خریدهای مورد نیاز پروژه با توجه به پروژه های مشابه
- تهیه نیازمندی طرح به تجهیزات خارجی (Key Equipment) توسط مدیریت طرح و اعلام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- بررسی و برآورد منابع مالی مورد نیاز سفارش تجهیزات Long Lead بر اساس پیشنهادات فنی شرکت Ineos با دوره تحویل بیش از ۱۸ ماه و ارائه به گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامدار عمده)
- تهیه اطلاعات مربوط به میزان و محل مصرف Chemical های افزودنی، کاتالیستها و روغنهای مصرفی در شرایط طراحی مجتمع توسط مدیریت طرح و ارائه به شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- نقشه برداری و پیاده سازی مسیر فنس کشی اراضی مجتمع
- بررسی و اصلاح اسناد مناقصه خدمات مهندسی زود هنگام در راستای شفاف سازی خدمات و حوزه پرداختها
- نقشه برداری جهت احداث پل ارتباطی بین فاز اول و دوم
- نهایی سازی اسناد مناقصه فنس کشی اراضی
- نهایی سازی اسناد مناقصه خط انتقال آب دوران ساختمان و نصب
- نهایی سازی اسناد مناقصه خدمات مهندسی زود هنگام
- نهایی سازی اسناد مناقصه کوله ها و دیوارهای حائل بین دو فاز



گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱



210	نام پروژه :	تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی پتروشیمی کازرون	کد پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	تاریخ گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	شماره گزارش :

• مالی / فاینانس

- تکمیل و ارائه پرسشنامه درخواست تسهیلات بانکی جهت اجرای طرح تولید پلی اتیلن سنگین به بانک ملی ایران - اداره کل بررسی طرحها
- اخذ تأییدیه قرارداد تجاری فیما بین شرکت و کنسرسيوم چینی از ادارات بررسی طرح ها و امور بین الملل بانک ملی ایران
- به روز رسانی گزارش مطالعات امکان سنجی طرح با توجه به تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز
- اخذ نامه تأییدیه گزارش مطالعات امکان سنجی (F.S.) طرح از وزارت نفت و ارائه به بانک ملی ایران
- اخذ تأییدیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص مبلغ قرارداد منعقد با کنسرسيوم چینی
- اخذ تأییدیه فنی، قراردادی و مالی از کارشناسان دایره اعتبارات بانک ملی ایران و نهایتاً پذیرش عاملیت طرح توسط بانک مزبور و ارسال مراتب به بانک مرکزی ایران
- ارسال الحاقیه قرارداد شماره AVIC/IRY/11M/5027 در مورد تغییر نرخ ارز مندرج در قرارداد از یورو به یوان چین به اداره کل بررسی طرحهای بانک ملی ایران
- انجام مکاتبات با بانکهای دولتی و خصوصی مورد تأیید بانک مرکزی جهت تشکیل سندیکا با بانک ملی ایران جهت تامین مابقی منابع مالی پروژه با توجه به محدودیت سقف اعتبار بانک ملی در تأمین فاینانس
- اعلام پذیرش عضویت و مشارکت سندیکایی (تا مبلغ ۵۰ میلیون یورو) بانک تجارت به بانک ملی ایران - اداره بررسی طرحها
- درخواست شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بانک مرکزی جهت تصویب طرح پتروشیمی کازرون در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و معرفی این شرکت به ساینشور جهت تسریع و تسهیل در تشکیل سندیکای بانکی
- تبدیل ارز قرارداد EPCF از یورو به یوان و همچنین تمدید مدت قرارداد با کنسرسيوم چینی AVIC/HFEC در پی عزیمت نمایندگان شرکت به کشور چین با توجه به الزام بانک مرکزی ایران





گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱



210	کد پروژه :	تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی پتروشیمی کازرون	نام پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

- برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده برای سال منتهی به ۹۰/۱۲/۲۹ در تاریخ ۹۱/۰۴/۲۸ در مرکز اصلی شرکت واقع در شهرستان کازرون با حضور اکثریت صاحبان سهام.
- ارسال گزارش نهایی توجیهی افزایش سرمایه به سازمان بورس و اوراق بها دار جهت اخذ تأیید از سازمان مزبور از اخذ مجوز هیئت مدیره
- برگزاری اولین مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به ۹۱/۰۶/۳۱ شرکت پتروشیمی کازرون در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۵ در مرکز اصلی شرکت واقع در شهرستان کازرون و با حضور اکثریت صاحبان سهام پس از تغییر سال مالی شرکت در اساسنامه
- شرکت در جلسه مورخ ۹۱/۰۷/۲۴ با موضوع هماهنگی تأمین منابع مالی از طریق فاینانس خارجی با حضور سفیر کشور چین در ایران و معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی

	<h2>گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱</h2>		
210	کد پروژه :	تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی پتروشیمی کازرون	نام پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

• عمومی/سایر

- برپائی غرفه پتروشیمی کازرون در نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی در بازدید وزیر محترم نفت و مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرحهای مستقر در شیراز و حضور در همایش و جلسه بررسی مسائل مربوط به صنایع استان و طرحهای پتروشیمی استانی در استانداری فارس با حضور وزیر محترم نفت و استاندار محترم فارس و دیگر مسئولین ذیربط استان
- انجام بررسی های لازم بر روی مطالعات اقتصادی و فنی چند طرح با سرمایه پائین جهت ایجاد و احداث واحدهای تکمیلی و پایین دستی پروژه با استفاده از خوراک تولیدی مجتمع (پلی اتیلن سنگین و سبک خطی) پیرو اعلام هیئت مدیره محترم
- تهیه طرحهای پائین دستی تکمیلی پلی اتیلن سنگین و سبک توسط شرکت گسترش صنایع پائین دستی پتروشیمی و ارائه آن به هیئت مدیره و سهامداران شرکت
- برگزاری جلسه با حضور نمایندگان سازمان خصوصی سازی ، امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک صادرات ایران ، پتروشیمی کازرون و پتروشیمی دهدشت پیرو واگذاری ۲۰٪ سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرف سازمان خصوصی سازی به بانک صادرات ایران
- کنترل، نظارت و راهبرد پیمانکاران اجرائی پروژه
- بررسی و پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران اجرائی سایت
- تهیه WBS و اوزان فعالیتهای شرکت پتروشیمی کازرون و انجام اقدامات لازم جهت نهایی سازی آن
- تهیه بودجه موردنیاز (Cash Flow) ارزی و ریالی برای سال ۱۳۹۲
- بررسی گزینه ها و راهکارهای جدید جهت افزایش زمین مورد نیاز پروژه تا سقف ۱۲۰ هکتار



گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱



210	کد پروژه :	تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی پتروشیمی کازرون	نام پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

- پیگیری درخواست شرکت پتروشیمی کازرون مبنی بر واگذاری باقیمانده اراضی موردنیاز در شمال اراضی فعلی از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان
- انجام نمونه برداری و تجزیه شیمیایی آب دریاچه بالا دست زمین مجتمع بمنظور تعیین نوع استفاده از آب آن در آینده علی الخصوص در هنگام اجرای عملیات سیویل
- بازدید کارشناسان اداره جهاد کشاورزی از سایت جهت بررسی مشکلات فضای سبز و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع آن
- تهیه گزارشات اجرای ضوابط مدیریت HSE مربوط به فعالیتهای سال ۱۳۹۱ و ارائه به سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس
- حضور نمایندگان پتروشیمی کازرون در کارگاه آموزشی بهداشت حرفه ای با موضوع بیماریهای شغلی و روشهای اندازه گیری عوامل زیان آور
- تهیه گزارشی تصویری شامل آنالیز بارش، اثرات آب شستگی در نواحی مختلف زمین و محدوده مسیلهها و عملکرد هدایت سیلاب بالادست فاز ۲ اراضی مجتمع توسط مدیریت طرح (MC)، جهت بررسی خسارت وارده متاثر از بارندگی شدید
- پیگیری تفکیک خط انتقال برق مجتمع از خط دادین بعلت مشکلات موجود در شبکه مزبور و بهبود شرایط در کمتر شدن قطعی برق



گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱



210	نام پروژه :	تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی پتروشیمی کازرون	کد پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	تاریخ گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	شماره گزارش :



۱- اهم فعالیتهای و تنگناهای پروژه

❖ تنگناها و مشکلات پیش رو که دستیابی به اهداف پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد

- تامین منابع مالی طرح
- تامین آب زمان بهره برداری
- تامین به موقع خوراک مجتمع
- تکمیل خط لوله انتقال خوراک
- تامین به موقع و اطمینان از برق زمان بهره برداری

❖ ارائه راه کارهای عملی

- بررسی راهکارها جهت ارائه تضامین لازم به منظور تامین منابع مالی مشتمل بر وثایق سهل البیع بلا معارض، ترهین محل اجرای طرح، سرمایه ثبتي شرکت، اعلام منابع مالی جهت سهم مالک از هزینه های سرمایه گذاری، ارائه سند مالکیت و تضامین
- ملزم نمودن پروژه های پتروشیمی گچساران و خط لوله اتیلن دنا نسبت به رعایت برنامه زمانبندی و اعلام دقیق زمان راه اندازی
- تامین و تولید برق در مجتمع
- پیگیری از طریق وزارت نیرو و مقامات استان جهت تأمین بودجه و اجرای به موقع عملیات سد نرگسی
- انجام امور سندیکایی با بانک عامل (بانک ملی ایران) و حل و فصل موانع معرفی طرح به ساینشور (از طرف بانک مرکزی ایران)

	گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱		
210	کد پروژه :	تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی پتروشیمی کازرون	نام پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

۲- برنامه زمانبندی طرح

- به پیوست شماره ۱ رجوع شود.

۳- جدول توزیع پیشرفت فیزیکی کل (واقعی/برنامه)

- به پیوست شماره ۲ رجوع شود.

۴- نمودار پیشرفت فیزیکی طرح (S-Curve)

- به پیوست شماره ۲ رجوع شود.





گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱



210	کد پروژه :	طرح پلی استال نودان	نام پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

بخش دوم

طرح پلی استال نودان شرکت پتروشیمی کازرون

 CCM Co.	<h1>گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱</h1>	 شرکت نیروی برق و انرژی
210	کد پروژه :	طرح پلی استال نودان
<i>210-RPT-CCM-GR/2</i>	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷
		نام پروژه :
		تاریخ گزارش :

۱. جدول مشخصات اصلی طرح

طرح پلی استال نودان		نام طرح
نودان استان فارس		محل احداث
۸ هکتار		مساحت زمین
ارزی	۱۰۶/۱ میلیون دلار	برآورد سرمایه گذاری طرح
ریالی	۳۷۷/۱ میلیارد ریال	
نرخ تسعیر	۹۸۵۰ ریال	
کل	میلیون دلار	
-		صاحبان لیسانس
-		پیمانکار اصلی طرح
-		نوع قرارداد
-		مبلغ قرارداد
-		محل تأمین اعتبار
-		تاریخ موثر شدن قرارداد
-		مدت زمان اجرای طرح
پلی استال ۲۰ هزار تن در سال		محصولات تولیدی (نام و ظرفیت)
میزان:	۲۳ هزار تن در سال	خوراک طرح
محل تأمین:	بندر عسلویه	
میزان:	۱۵۶۸ تن در سال	
محل تأمین:	پتروشیمی اصفهان	بنزن
میزان:	۴۴۸ تن در سال	اتیلن اکساید
محل تأمین:	پتروشیمی اراک	
میزان:	۲۲۱۰۰ مگاوات ساعت در سال	
محل تأمین:	تعیین منبع تامین برق در دست بررسی میباشد.	برق
میزان:	۹۶۹ هزار متر مکعب در سال	یوتیلیتی مورد نیاز دوران بهره برداری طرح
محل تأمین:	تعیین منبع تامین آب در دست بررسی میباشد.	
میزان:	۱۰/۵ میلیون نرمال متر مکعب در سال	
محل تأمین:	-	گاز طبیعی
آیتم شماره ۱۱ - جدول ج		ترکیب سهامداران طرح
		تعداد افراد شاغل در زمان اجرا و ساخت
۲۲۰ نفر (۱۵۴ نفر کارشناس، ۶۶ نفر فوق دیپلم و دیپلم)		تعداد افراد شاغل در زمان بهره برداری





گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱



210	کد پروژه :	طرح پلی استال نودان	نام پروژه :
<i>210-RPT-CCM-GR/2</i>	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

۲. جدول وضعیت سهامداران

ردیف	نام سهامدار	درصد سهامداری	تعداد سهام	آورده نقدی سهامداران	
				ریالی	ارزی
۱	شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۶٫۲۴٪	۱۶۵٫۱۹۰٫۷۶۹		
۲	شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۱۹٫۷۸٪	۹۰٫۱۷۷٫۰۹۶		
۳	شرکت شادان شهر باختر	۱۱٫۹۴٪	۵۴٫۴۱۱٫۴۵۲		
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران	۵٫۴۸٪	۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰		
۵	شرکت بیمه توسعه	۵٫۴۸٪	۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰		
۶	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۰٫۱۱٪	۵۰۰٫۰۰۰		
۷	شرکت مهر آوران کوی نارون (سهامی خاص)	۰٫۳٪	۹۵۱٫۵۲۲		
۸	شرکت پتروشیمی گچساران	۰٫۰۲٪	۱۱۲٫۰۰۰		
۹	مجتمع پترو صنعت گامرون	۰٫۰۲٪	۱۰۰٫۰۰۰		
۱۰	شرکت تعاونی کشاورزی رضوان سداد	۰٫۰۱٪	۵۰٫۰۰۰		
۱۱	تعاونی روستایی شهید رجایی مرودشت	۰٫۰۱٪	۳۰٫۰۰۰		
۱۲	شرکت سرمایه گذاری ایران	-	۳۰٫۰۰۰		
۱۳	شرکت بازرگانی پتروشیمی	-	۱۰٫۰۰۰		
۱۴	شرکت کالا بازار ایرانیان	-	۱۰٫۰۰۰		
۱۵	شرکت فراساحل ایران	-	۱۰٫۰۰۰		
	جمع کل سهامداران حقوقی	۷۹٫۳۹٪	۳۶۱٫۹۲۷٫۰۵۹		
	کل سهامداران حقیقی	۲۰٫۶۱٪	۹۳٫۹۵۸٫۴۲۳		
	مجموع سهامداران حقوقی و حقیقی	۱۰۰٪	۴۵۵٫۸۸۵٫۴۸۲		

 CCM Co.	<h2>گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱</h2>		 شرکت پتروشیمی نودان (تاسیس ۱۳۵۶)
210	کد پروژه :	طرح پلی استال نودان	نام پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

۳. اهم فعالیتها و اقدامات انجام شده

- دریافت مجوز شماره ۹۱/۴۰/۳۲۳۱/ص مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ از سازمان محیط زیست استان فارس مبنی بر موافقت با اجرای طرح پتروشیمی نودان
- تشکیل جلسه با شرکت کیمیا فن آوران معین در خصوص شفاف سازی مراحل مشارکت در امر احداث واحد پلی استال شهرستان نودان و تهیه برنامه اجرائی و زمانبندی پروژه در قالب (Project Action Plan) که پس از تصویب در هیئت مدیره محترم شرکت پتروشیمی کازرون به مرحله اجرا گذاشته شود.
- انعقاد قرارداد حفظ راز داری با شرکت کیمیا فن آوران معین جهت تبادل اطلاعات مربوط به امور اقتصادی و فنی طرح و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت در اجرای پروژه
- بررسی پیشنهاد اخذ شده از شرکت سرمایه گذار خارجی در خصوص تامین منابع مالی، تامین لیسانس، مهندسی پایه و تامین تجهیزات خارجی
- پیگیری تأمین و اخذ دانش فنی و تکنولوژی واحد پلی استال نودان از طریق معاونت محترم انرژی مرکز همکاریها و فن آوری ریاست جمهوری و شرکت کیمیا فن آوران معین
- شرکت در جلسه مورخ ۹۱/۰۷/۱۰ دفتر بررسی و برآورد طرح ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص معرفی شرکت های تأمین کننده تکنولوژی پلی استال و اقدامات مربوط به آن
- برگزاری جلسه در دفتر امور بررسی و برآورد طرحها شرکت ملی صنایع پتروشیمی با موضوع اخذ دانش فنی طرح پلی استال (اقدامات لازم جهت اخذ پیشنهادات فنی و بازرگانی مورد نیاز در دست پیگیری می باشد).
- بررسی و مقایسه تکنولوژی جدید پیشنهادی واحد پلی استال با تکنولوژی قبلی و پیگیری دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد نوع و تعداد تجهیزات و مشخصات فنی
- بررسی پیشنهاد فنی شرکت کیمیا فن آوران معین پیرو دریافت پیشنهادات مالی و فنی از این شرکت (لازم به ذکر است که پیشنهاد فنی این شرکت در دست مطالعه بوده و بررسی پیشنهاد مالی منوط به تکمیل مطالعات و



گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱



210	کد پروژه :	طرح پلی استال نودان	نام پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

تحقیقات فنی پروسسی و در صورت نیاز بازدید از یک پروژه پلی استال در حال بهره برداری با تکنولوژی یکسان خواهد بود.) بهمین منظور جلسه ای با حضور اعضاء منتخب هیئت مدیره و مدیرعامل با مشاور برگزار تا اقدامات ضروری پیش بینی و عملیاتی گردد .

- تهیه ویزای ورود به ایران جهت کارشناسان خارجی برای حضور در جلسات معرفی نوع فرآیند و پاسخ به سوالات کارشناسان فنی و قراردادی به منظور تصمیم گیری در تعیین و اخذ دانش فنی و تکنولوژی و مهندسی واحد بر اساس پیشنهادات ارائه شده .
- برگزاری جلسه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور ارائه توضیحات و اطلاعات کامل فنی در خصوص تکنولوژی طرح پلی استال شهرستان نودان با حضور کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی و توسعه
- بررسی و ارائه راهکارهای لازم جهت تامین لیسانس طرح پلی استال شهرستان نودان با توجه به ماموریت مدیریت طرحها در خصوص تسهیل و تسریع تامین لیسانس طرحهای مصوب هیات مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، و ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده تاکنون
- برگزاری جلسه در خصوص بررسی راهکارهای تأمین لیسانس طرح پلی استال نودان جهت آغاز مراحل مهندسی و اجرایی طرح با حضور شرکت پتروشیمی کازرون، مدیریت برنامه ریزی و توسعه، شرکت شفق صنوبر یزد و نمایندگان معاونت راهبردی و فن آوری انرژی نهاد ریاست جمهوری در تاریخ ۲۶ و ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱
- برگزاری جلسات با حضور ۳ نفر از کارشناسان خارجی و متخصص در زمینه تولید پلی استال در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ در تهران در خصوص واگذاری دانش فنی و انجام مهندسی اصولی و تفصیلی، خرید و تأمین دستگاه های طرح، آموزش پرسنل و ارائه کمکهای فنی برای راه اندازی و تولید مجتمع



گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱



210	کد پروژه :	طرح پلی استال نودان	نام پروژه :
210-RPT-CCM-GR/2	شماره گزارش :	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	تاریخ گزارش :

۴. اهم فعالیتها و تنگناهای پروژه

❖ تنگناها و مشکلات پیش رو که دستیابی به اهداف پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد

۱- اخذ مجوز ليسانس از منابع خارجی

۲- تأمين آب مورد نیاز پروژه

۳- تأمين منابع مالی مورد نیاز طرح

❖ ارائه راه کارهای عملی

۱- مذاکرات با شرکت ها و مشاوران خارجی

۲- مطالعات لازم در مورد منابع آب منطقه از جمله حفر چاه جدید و استفاده از چاه های موجود در منطقه و


همچنین اخذ مجوزهای لازم از سازمان آب منطقه ای

۳- مذاکرات با بانکها های داخلی و سرمایه گزاران بخش خصوصی و استفاده از اعتبارات موجود شرکت



CCM Co.

Kazeroon LDPE/HDPE Project

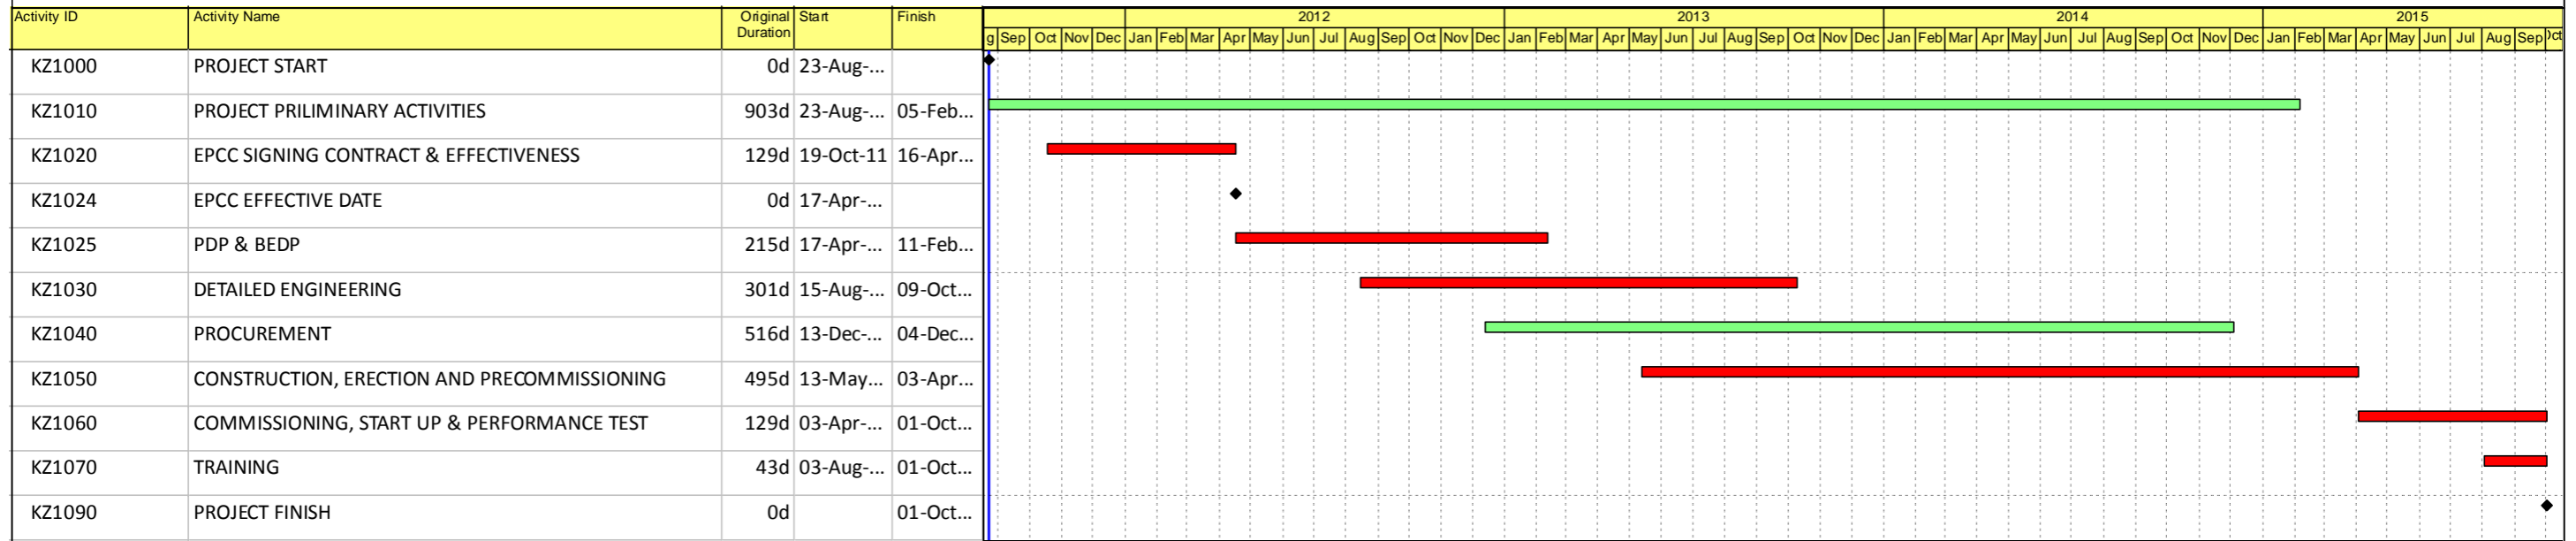

- Actual Work
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- ◆ Milestone
- ▾ Summary



Kazeroon LDPE/HDPE Plant - Overall S-Curve

